



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
- Gabinete do Prefeito -



OFÍCIO Nº 1085/2023

Em 05 de Maio de 2023.

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
**PAULO LANDIM**  
MD. Presidente da Câmara Municipal  
Rua São Bento, 887.  
CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

**Câmara Municipal de Araraquara**  
Protocolo: 4379/2023 **de 05/05/2023 16:38**  
Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 226/2023  
Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE LEGISLATIVO.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, pelo presente, em resposta ao **Requerimento nº 226/2023**, de autoria do Vereador **LINEU CARLOS DE ASSIS**, em anexo, encaminhamos as informações, conforme manifestação prestada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**EDINHO SILVA**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**OFÍCIO Nº CEOP 025/2023**

Araraquara, 18 de Abril de 2023.

À  
**Coordenadoria Executiva de Articulação Institucional**

**Ref: Requerimento nº 226/2023.**

Cumprimentando-lhe cordialmente, em atenção ao requerimento supra referenciado, sirvo-me do presente para esclarecer o que segue.

Após a formalização do Convênio nº 363/2020-SDR-PRC-2020/2023, publicado em 15/08/2020, foi inaugurado o Guichê 10.273/2021 referente ao Processo Licitatório nº 868/2021, Tomada de Preços nº 004/2021, com entrega dos envelopes para 27/04/2021, que culminou na desistência da primeira colocada e formalização do **contrato nº 5478-2021, com a segunda colocada, com Ordem de Serviço emitida em 02 de julho de 2021** com prazo de execução de 180 dias corridos, ou seja 29/12/2021.

Na segunda quinzena de **agosto de 2021**, durante a execução da etapa inicial da obra, mais especificamente no planejamento de execução das estacas da nova ponte, foi identificada a necessidade de realizar o desvio dos dutos da Cutrale, onde pela proximidade com a rede poderia ocorrer o rompimento daquela tubulação tornando temerária a execução das estacas com possíveis prejuízos ao meio ambiente e à indústria. Momento no qual a Secretaria de Obras realizou reunião presencial com a Cutrale a fim de averiguar quanto à destinação da tubulação existente, bem como de apresentar o projeto de execução da nova ponte.

Diante das informações apresentadas e do devido estudo de caso a Cutrale protocolou já em **26/08** o **Guichê 51.697/2021** formalizando o pedido de paralização da obra para a execução do desvio da tubulação, com prazo estimado de 90 dias, quando o Município efetuou a necessária **suspensão do contrato por 120 dias**, conforme estipula a Lei 8.666/1993.

Porém a Cutrale protocolou em **20/10**, sob **guichê nº 65.154/2021** comunicado informando a antecipação da obra e conclusão dos serviços.

Restava ainda a execução dos serviços da concessionária de energia **CPFL Paulista**, realocação dos postes e rede de energia, os quais foram solicitados em **09/08/2021**, gerando o **Protocolo/Atividade nº 0809779001**, e que foram concluídos em **15/11/2021**, conforme contato telefônico da concessionária, assim o Município solicitou a **retomada da obra em 25/11/2021**.

Com a retomada das obras, após a mobilização inicial bem como a execução de serviços preliminares, foi providenciada a **"Ocupação Temporária"** através do **DECRETO Nº 12.800, DE 26 DE JANEIRO DE 2022**, em virtude de as tratativas com o particular terem se mostrado lentas e ineficientes, para o uso de estrada de terra e implantação do necessário desvio.

Somente após a aplicação do poder de império foi possível a efetiva demolição da ponte.


Todavia, apesar dos esforços da municipalidade em executar as obras necessárias, a retomada se deu ainda no período de chuvas, o que prejudicou em muito o andamento dos serviços. Por diversas vezes os serviços foram interrompidos por conta do volume da água que chegou ao nível da pista, conforme imagem abaixo retirada de registro em vídeo.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**



Ocorreu ainda caso em que o operador da máquina que trabalhava no leito do rio precisou abandonar o equipamento por conta da cheia repentina ocasionada por chuvas na região, conforme mostra registro fotográfico abaixo:

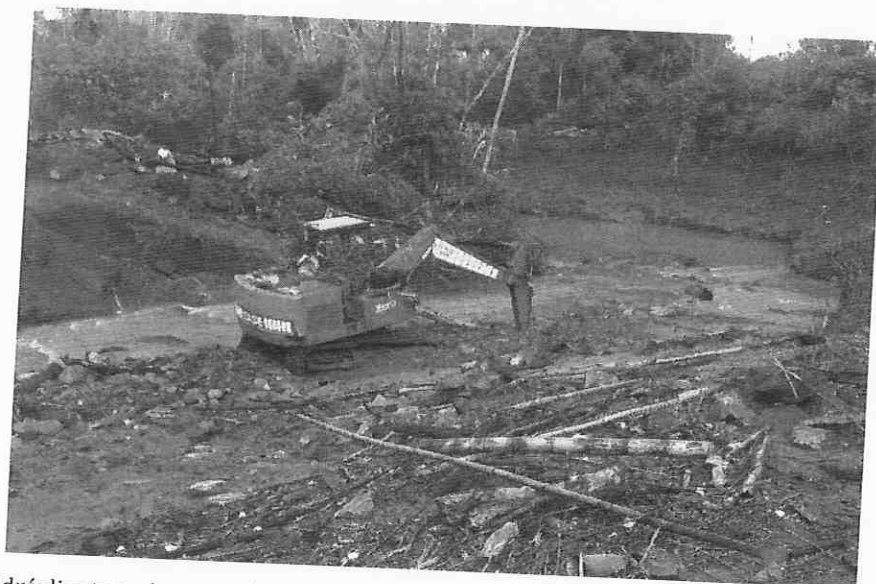

Escavadeira hidráulica tomada por resíduos e detritos após a cheia repentina do rio em **17/03/2022**.

Em **30/03/2022**, esta Secretaria notificou a empresa em virtude do ritmo da obra, a qual apresentou defesa em **02/04/2022** se justificando pelas dificuldades com a pandemia, chuvas, bem



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

como custo dos insumos em virtude da situação de guerra entre a Rússia e Ucrânia. Ainda assim independente dos fatores alegados se comprometeu, pelo período de estiagem, em se empenhar para a conclusão na maior brevidade possível.

Em meados de agosto a obra não demonstrou bom ritmo e a empresa foi chamada para tratativas onde em 06/09 o representante da empresa esclareceu ao Secretário de Obras e à Secretária de Governo, Planejamento e Finanças que aguardava a entrega de estacas pré-moldadas necessárias para fundação das cabeceiras da nova ponte e para a continuidade dos serviços.



Há de se considerar ainda que, o referido contrato é oriundo do **Convênio Estadual nº 363/2020-SDR-PRC-2020/00823**, com valor de repasse **R\$ 2.140.428,92** e contrapartida de **R\$ 68.992,44**, perfazendo um total de **R\$ 2.209.421,36** com início em 14/08/2020 e vigência de 720 dias. A respectiva **Ordem de Serviço** foi emitida em **02/07/2021**, porém o repasse da primeira parcela dos recursos estaduais, no valor de R\$ 300.000,00, se deu somente em **02/03/2022**.

No decorrer da obra foram efetuadas quatro medições, que consumiram a totalidade da primeira parcela de repasse e o total da contrapartida municipal, restando em aberto o valor de **R\$ 93.690,06**.

MEDIÇÕES REALIZADAS	DATA DE PROTOCOLO	VALOR DA NOTA FISCAL	PERCENTUAL DA OBRA
1ª MEDIÇÃO	09/02/2022	R\$ 156.443,68	7,08%
2ª MEDIÇÃO	26/05/2022	R\$ 78.981,42	3,57%
3ª MEDIÇÃO	07/07/2022	R\$ 121.872,00	5,52%
4ª MEDIÇÃO	21/07/2022	R\$ 105.385,40	4,77%
TOTAL		<b>R\$ 462.682,50</b>	<b>20,94%</b>


Neste interim o Município iniciou as tratativas referentes ao repasse e também quanto à prorrogação do convênio tendo em vista a demora do repasse das parcelas. **Tais tratativas foram concluídas pelo estado somente em 16/09/2022**, com o envio do **Termo Aditivo do Convênio**, prorrogando sua vigência em **mais 720 dias** ficando seu término para **24/07/2024**.

Em visita ao local da obra nos dias 05/10 e 06/10 foi verificada a presença da empresa e efetiva continuidade dos serviços com a retirada de árvores e de enrocamento dos taludes conforme fotos abaixo:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

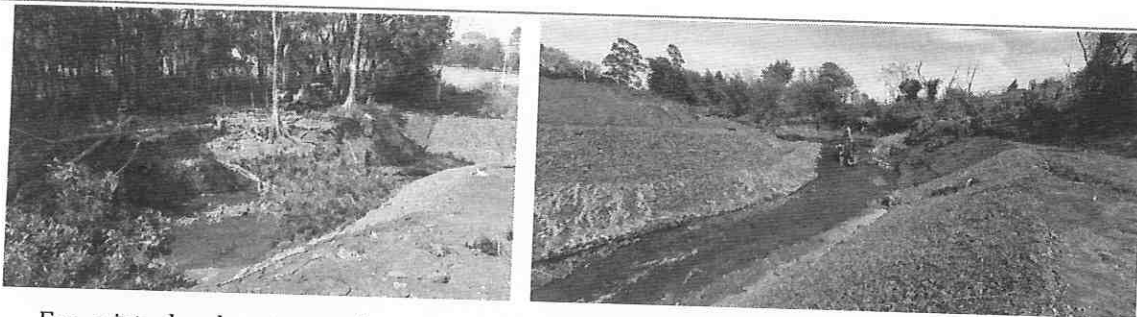

Em virtude de atraso de fornecedores as estacas foram efetivamente entregues em 15/12/2022.



Em vistoria realizada em 30/01/23, foi constatada a realização da cravação das estacas, o que iria possibilitar a execução da superestrutura da OAE.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Nestes comenos houve três novas medições de 5ª à 7ª, somando R\$ 129.132,44 que junto aos R\$ 93.690,06 da 4ª medição perfazendo um total, a **receber**, de R\$ 222.822,50 a favor da empresa, que, como o Município, aguarda o crédito do repasse do Estado.

MEDIÇÕES REALIZADAS	DATA DE PROTOCOLO	VALOR DA NOTA FISCAL	PERCENTUAL DA OBRA
1ª MEDIÇÃO	09/02/2022	R\$ 156.443,68	7,08%
2ª MEDIÇÃO	26/05/2022	R\$ 78.981,42	3,57%
3ª MEDIÇÃO	07/07/2022	R\$ 121.872,00	5,52%
4ª MEDIÇÃO	21/07/2022	R\$ 105.385,40	4,77%
5ª MEDIÇÃO	10/11/2022	R\$ 8.058,60	0,36%
6ª MEDIÇÃO	25/11/2022	R\$ 39.294,53	1,78%
7ª MEDIÇÃO	20/12/2022	R\$ 81.779,31	3,70%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 591.814,94</b>	<b>26,97%</b>





Em vistoria junto à obra, nesta data (09/02/2023), foi constatado a ausência de equipes de execução da empresa no local, bem como foi constatado pouca, ou nenhuma, evolução desde 30/01, vide fotos abaixo.

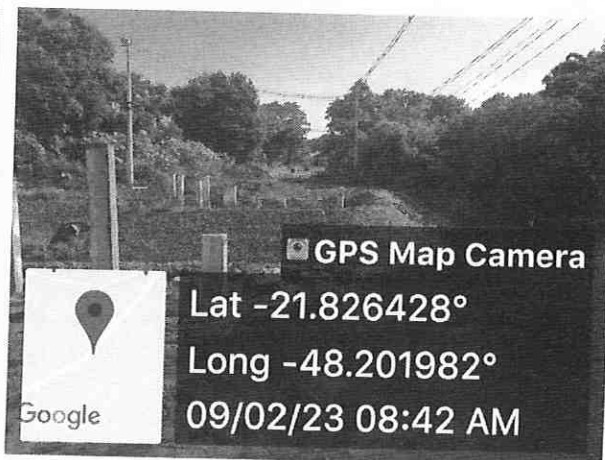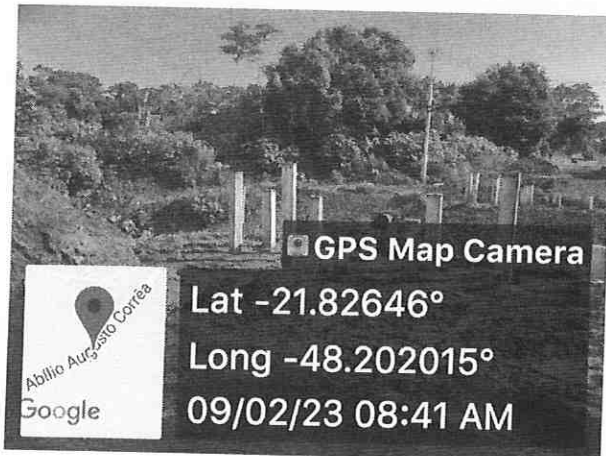



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

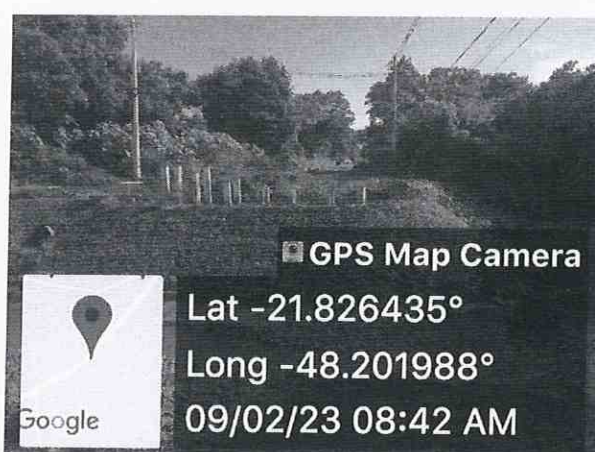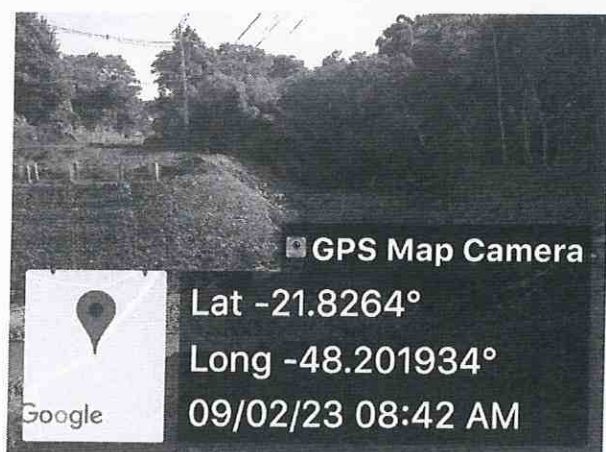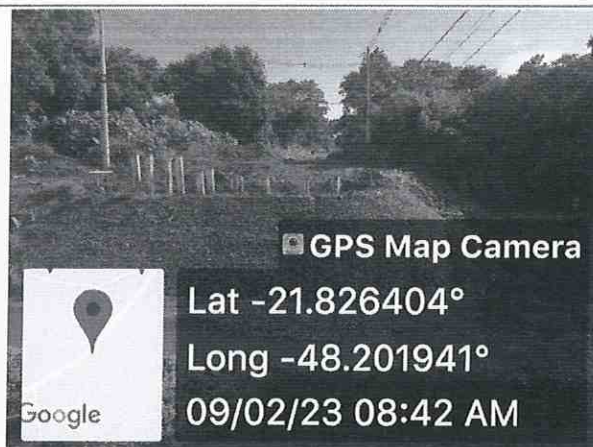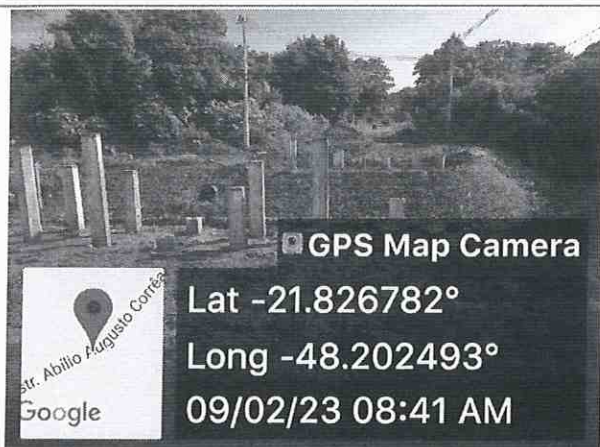

Diante desta situação, foi formalizado pedido de notificação junto à Gerencia de Contratos da Secretaria de Planejamento e Finanças, que estabeleceu prazo para defesa da empresa até 17/02/2023. Tais tramites administrativos incluindo prazos legais, e a ampla defesa culminaram na rescisão contratual publicada em 24/03/2023. Com isso a terceira colocada fora convocada e demonstrou interesse na execução do saldo contratual, assim o respectivo contrato encontra-se em formalização para a devida retomada e conclusão do objeto licitado.

Impende destacar que em cumprimento às leis de transparência e diretrizes do TCESP, as informações referentes à paralização da obra foram devidamente lançadas no sistema "AUDESP" ensejando fiscalização do TCESP com vistas à integra do processo e vistoria junto à Ponte em 21/10/2021.

Para todos os efeitos, informamos que a integra do processo licitatório encontra-se disponível no Portal da Transparência do Município, no endereço <http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao>.

Sem mais, firmo o presente com votos estima e distinta consideração.

  
**Sérgio José Pelicolla**

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
